

DESARROLLO ECONÓMICO

Y SOCIAL

2021 - 2024

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FISE 2021

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA A REVISAR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. FELIPE DE JESUS MIRAMONTES ROMERO	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ELENA ORTIZ CASTAÑEDA	REGIDORA DE LA COMISION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ARMANDO GUTIERREZ RIVERA	REGIDOR DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ	TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJÓN EN EL BARRIO LA CIÉNEGA, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC".

FECHA DE INICIO:	12/11/2021
FECHA DE TERMINO:	17/11/2021
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACION DIRECTA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FONDO III 2021.



GOBIERNO DE
**SANTA MARÍA
DE LA PAZ**
2021 - 2024

INVERSIÓN AUTORIZADA


NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
1	\$127,652.90		\$127,652.90	20

INVERSIÓN EJERCIDA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
1	\$127,652.90		\$127,652.90	20

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA **C. RUBEN VALERO RAMIREZ**, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.



DESARROLLO ECONÓMICO

Y SOCIAL

2021 - 2024

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

LA DEPENDENCA NORMATIVA ASI COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (SE ANOTARAN LAS CAUSAS).

ENTREGA

ING. FELIPE DE JESUS MIRAMONTES ROMERO
SECRETARÍA DE LA PAZ, ZAC.

RECIBE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. RUBEN VALERO RAMIREZ.

CONSEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. SAMUEL CARLOS PUENTES

RESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
DE LA PAZ, ZAC.

REGIDORA
COMISION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. ELENA ORTIZ CASTAÑEDA

REGIDOR
COMISION DE OBRAS PUBLICAS

C. ARMANDO GUTIERREZ RIVERA

TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ

POR EL CONTRATISTA

C. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


C. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.




DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL
2021 - 2024

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJON EN EL BARRIO LA CIENEGA, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.





INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJON EN EL BARRIO LA CIENEGÁ, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

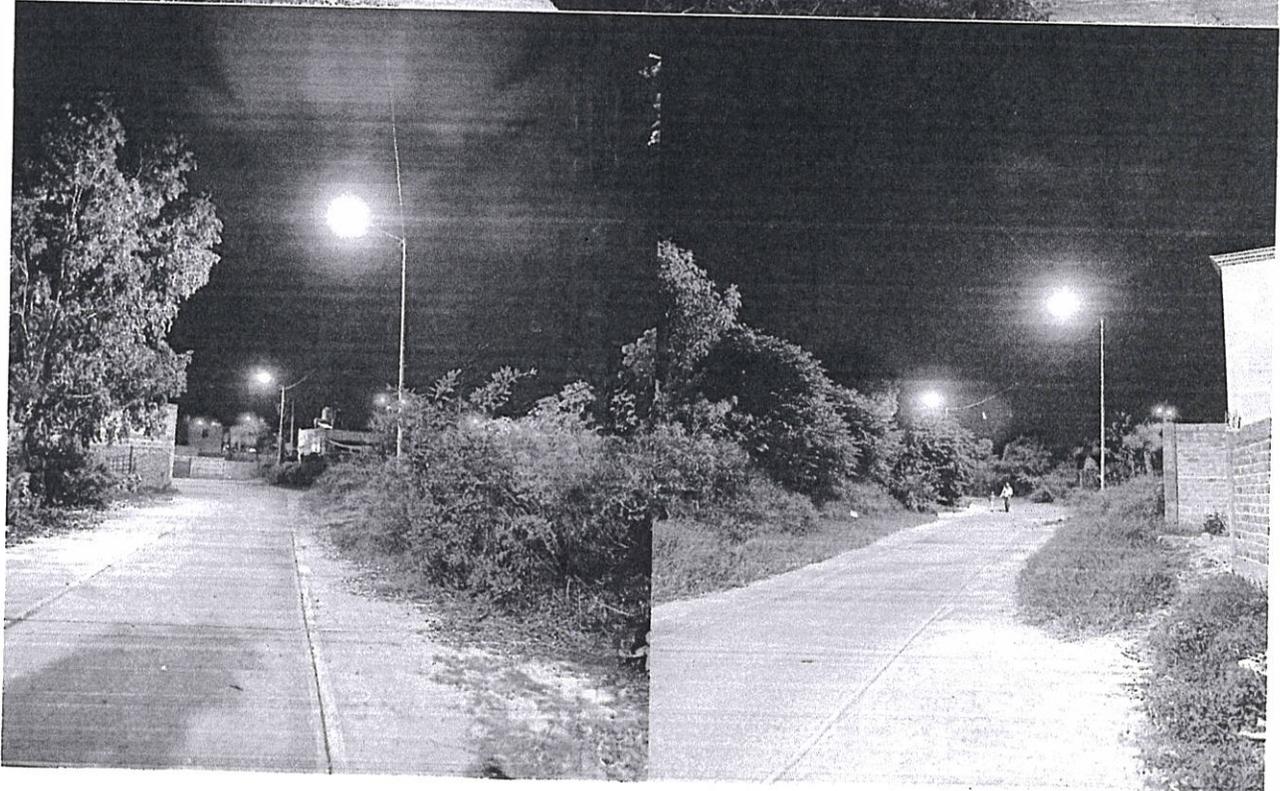



INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJON EN EL BARRIO LA CIENEGA, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

